

10 Juin 2021

# GT CURTE GRD

# Ordre du jour

1. **ACTUALITÉS**
   - Validation du CR du GT GRD du 17/03/2021
   - Retours sur la CAR du 19/05/2021
   - Augmentation des délais de réponses aux PTF
2. **S3R ENR**
   - Avancements des schémas
   - Insertion des automates
3. **CYCLE DE VIE DES AUTOMATES**
4. **ATELIER CART GRD TURPE 6**



1

# Actualités

# Validations des Comptes rendus précédents

- GT GRD du 17 Mars 2021

# Retours de la CAR du 19/05/2021

## Insertion opérationnelle des EnR

- **Travaux en cours sur la modulation technique des parcs EnR:** appel à manifestation d'intérêt (GRD et Producteurs) pour participer aux GTs techniques sur la modulation de production EnR (HTA ou HTB) pour des besoin RPT. Contact: gaetan.desquilbet@rte-france.com

- **Industrialisation de l'indemnisation des écrêtements EnR:** Travaux en cours sur les méthodes standard de calcul de l'énergie non évacuée. Proactivité des GRx demandée par les producteurs pour l'été 2021.

- **Contraintes RPT 2021 à l'injection:** Nombre de zones en contraintes en augmentation par rapport à 2020, conformément aux remplissages des S3R EnR.

- **Projet STAR sur la traçabilité des écrêtements EnR:** appel à manifestation d'intérêt pour participer aux GTs à venir. Contact: lucian.balea@rte-france.com

# Retours de la CAR du 19/05/2021

## Gestion de la tension RPT avec les leviers HTA

L'appel à contribution fait apparaitre une activation du gisement en 2 temps :

1) **A court terme, le réglage en tangente phi est le seul disponible.** Il permet à cout modéré de compenser une partie du réactif généré par le câble de raccordement. Toutefois, ce réglage n'exploite pas pleinement les capacités réglementaires des parcs.

2) **A moyen terme, une utilisation complète des capacités existantes rendrait un meilleur service au réseau.** Les parcs ENR HTA récents sont majoritairement déjà aptes (Deie) moyennant des adaptations logicielles. Toutefois cela nécessite une instruction détaillée et une mise à jour majeure des dispositifs existants (DTR, CARD, gabarit tarifaire à l'interface RPT/RPD…) envisageable à horizon Turpe 7




# Gestion de l'afflux des demandes de raccordement


GT CURTE GRD du 10 juin 2021

# Accélération de l'augmentation des demandes de raccordement : + 60 % entre T1 2020 et T1 2021

## Demandes de raccordement : Production, Stockage, Interconnexion

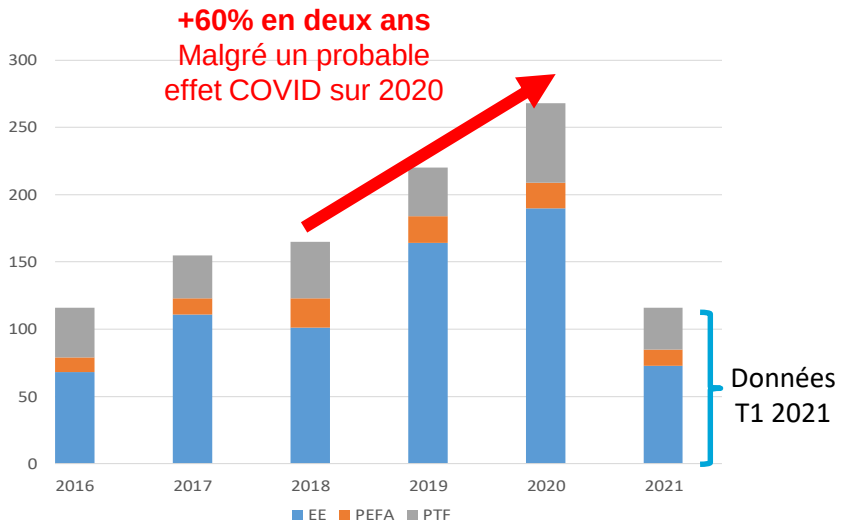


## Demandes de raccordement : Consommation, Distribution

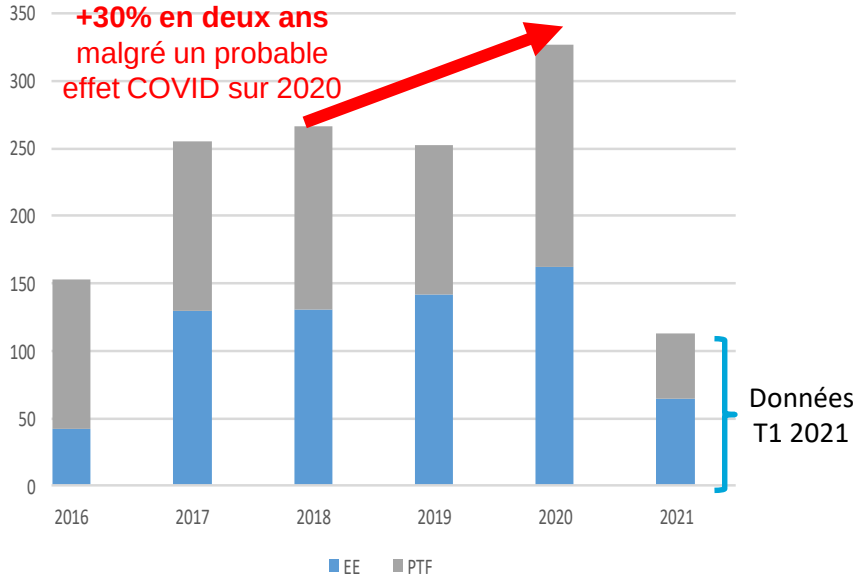


**Des disparités importantes entre les régions (pouvant aller du simple au triple)**

# Allongement du délai de remise des offres de raccordement




- Afin de faire face au nombre croissant de demandes, le délai de réponse aux demandes de raccordement (PTF/PEFA) sera de 4 mois au lieu de 3 mois, pour tous les clients du RPT.

- Les études d'insertion se feront toujours en 9 semaines afin de permettre aux GRD de soumettre leurs PTF aux producteurs HTA en moins de 3 mois.

- Les Conventions Techniques de Réalisation et de Planification (CTRP) pour les S3REnR ne sont pas impactées.

**Le délai de réponse aux demandes de PTF sera de 4 mois au lieu de 3 mois**

# Adaptation des offres à la maturité des projets

**RTE à l'écoute de ses clients pour les accompagner dans leurs projets et les conseiller sur leur raccordement**

1. Actions court-terme engagées :

| | |
|---|---|
| **Demande client de raccordement pour un projet dont la localisation est amenée à évoluer** | ➢ **Réorienter le client en amont vers une étude exploratoire** |
| **Offre de raccordement d'une installation de production EnR dont le coût apparaît exorbitant** | ➢ **Conseiller le client de reconsidérer éventuellement son projet au-delà d'un seuil** |
| **Offre de raccordement sur un poste prévu au S3REnR dont la localisation est incertaine** | ➢ **PTF avec réserve et clause de revoyure une fois défini l'emplacement du poste.** |

2. Actions moyen-terme à engager : se réinterroger sur les critères d'entrée en file d'attente …

**Notre objectif : satisfaire nos clients en leur apportant une offre adaptée à leurs projets**
