Réseau de transport d'électricité

# Projet Refonte Enchères France-Espagne

CFAI 13 novembre 2012

Galileo BARBIERI

# Périmètre du projet

- X-Regional Roadmaps ACER
- Inclusion de la frontière FR-ES dans le périmètre de CASC pour les horizons de long terme
- Règles harmonisées (**HARs**)

| | PROCESSUS | Actuel | | Cible |
|---|---|---|---|---|
| Longs Termes | Ench. annuelles | REE | ▶ | CASC |
| | Ench. mensuelles | Rte | ▶ | CASC |
| | Marché secondaire | Rte | ▶ | CASC |
| | Nominations | REE / Rte | ▶ | REE / Rte |
| Journalier | Enchères | Rte | ▶ | Rte |
| | Nominations | REE / Rte | ▶ | REE / Rte |
| Infra J | Enchères | REE | | REE |
| | Nominations | REE | | REE |

# Avancement du projet

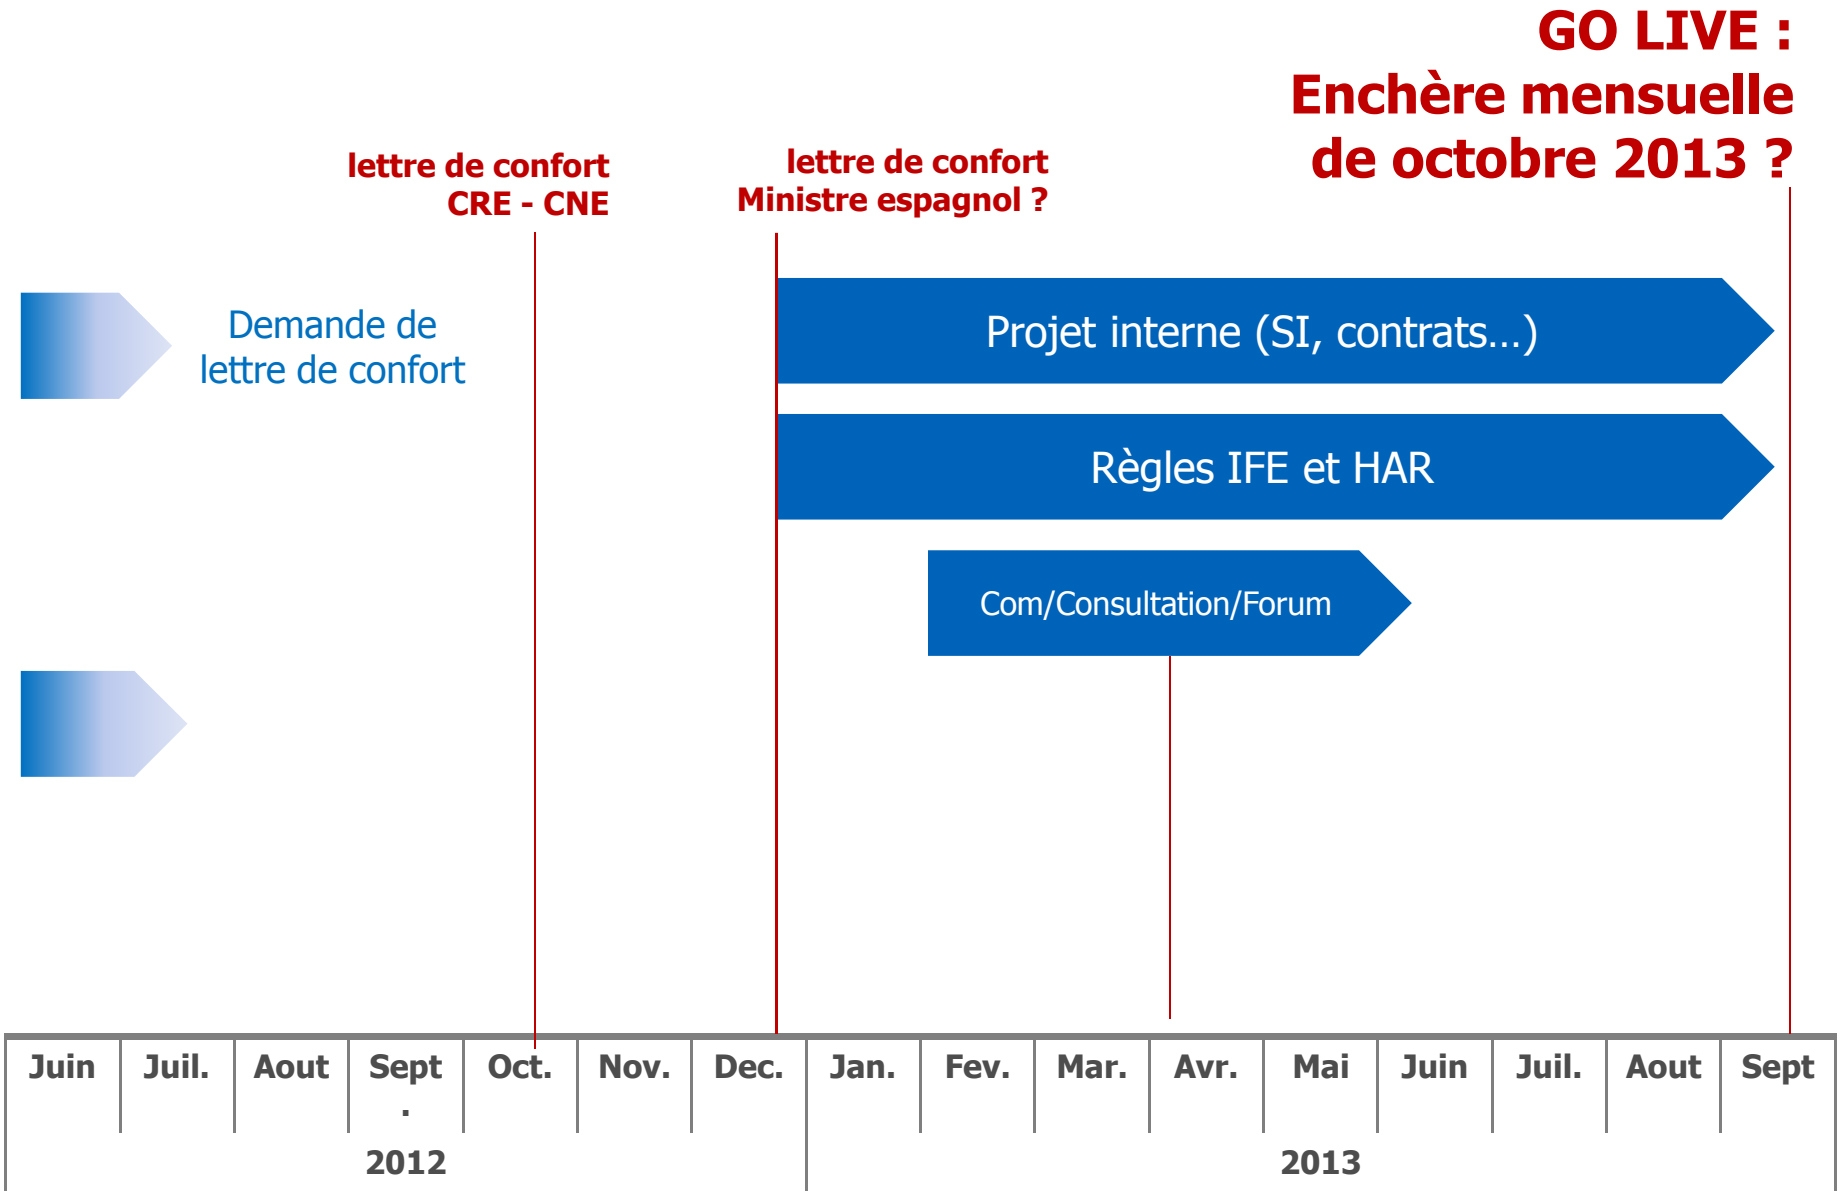
**10th IG Meeting (14/05/2012, Paris) - Réunion GRTs - Régulateurs**

- Demande de lettre de confort

**6th Stakeholder Group meeting of the ERI SW region (25/11/2012, Madrid)**

- Réception des lettres de confort de la part des régulateurs
- En attente du ministre espagnol

# Planning ?


GO LIVE :
Enchère mensuelle
de octobre 2013 ?
lettre de confort
CRE - CNE
lettre de confort
Ministre espagnol ?
Demande de
lettre de confort
Projet interne (SI, contrats…)
Règles IFE et HAR
Com/Consultation/Forum
Juin
Juil.
Aout
Sept
.
Oct.
Nov.
Dec.
Jan.
Fev.
Mar.
Avr.
Mai
Juin
Juil.
Aout
Sept
2012
2013

# Règles / Consultation

**Impacts sur les règles :**

- Deux jeux de règles (court-terme : IFE 4.0 ; long-term : HAR v2.0)
- HAR 2.0 : évolutions des HAR sur les autres frontières !
  - Wish list ACER
  - Garanties bancaires
  - FTR
  - …
  - →**nécessité de coordonner les évolutions**
- IFE 4.0 : redéfinition du périmètre
- Règles Import-Export

- **Consultation / approbation**
  - Information aux acteurs de marché : *Janvier 2012*
  - Consultation publique / Forum : *~Avril 2013 (3 semaines)*
  - Soumission règles pour approbation finale : *Mai 2013*
